



Haushalt 2020

Teilhaushalt 65

Laatzen, den 04. November 2019

Jürgen Pagels Fachbereichsleiter

Volker Dopke Teamleiter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes

- 651100 – Neu-, Um- und Erweiterungsbau *
- 651300 – Energiewirtschaft - strategisch

Maßnahmen 2019 im Ergebnishaushalt zzgl. HH-Reste

Sachstand

	○	○	○
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AES Brandschutzsanierung BA IV – NTW/C-Trakt: Planung 	●		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ EKSZ Sanierung Halle II EKS, Fertigstellung 	●		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kita Brucknerweg, Sanierung TGA, Bäder, WC's ▪ Fertigstellung 	●		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kita Wülferoder Straße, Sanierung Attika 	●		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ GBS 15, Sanierung OGII, Fertigstellung 	●		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ „Treff“ Alte Schule Gleidingen, Planung 		●	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jott, Sanierung Innen, Fertigstellung 		●	

Investive Maßnahmen 2019 zzgl. HH-Reste

	Sachstand		
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▪ Feuerwehr Rethen-Gleidingen, Fertigstellung	<input checked="" type="radio"/>		
▪ Erweiterung GS Rethen, Planung	<input checked="" type="radio"/>		
▪ Erweiterung GS Ingeln-Oesselse, Planung	<input checked="" type="radio"/>		
▪ Erweiterung AES / Kiefernweg, Planung	<input checked="" type="radio"/>		
▪ Neubau GS im langen Feld, Planung	<input checked="" type="radio"/>		
▪ Kita Würzburger Straße, Planung	<input checked="" type="radio"/>		
▪ Kita Lavendelweg, Planung	<input checked="" type="radio"/>		
▪ Kita Pinienweg Neubau, Fertigstellung	<input checked="" type="radio"/>		


Maßnahmen im Ergebnishaushalt in Planung ab 2020

- Grasdorf Alte Feuerwache
 - Baugenehmigung erwartet
 - Vergabe Bauleistung
 - Baubeginn mit Fluchttreppe ab Frühjahr 2020
- Erbenholz barrierefreier Zugang / Außenanlagen
 - Ausführung ab 01/2020
- Seniorentreff Gleidingen Fluchttreppe
 - Planung und Ausschreibung
 - Ausführung 2. Hälfte 2020
- Sanierung Fassade GS Rathausstraße (2021)

Investive Maßnahmen in Planung ab 2020

- Kita Lavendelweg geplante Ausführung I/2020-12/2020
- Kita Würzburger Straße geplante Ausführung III/2020-10/2021
- Neubau Erich Kästner Schulzentrum geplante Ausführung bis I/2024
- GS Rethen Erweiterung geplante Ausführung Anbau I/2020 – I/2022
- AES Erweiterung geplante Ausführung III/2020-II/2022
- GS Ingeln-Oesselse Neubau geplante Ausführung IV/2020-II/2022
- GS Im Langen Feld, Neubau geplante Ausführung bis IV/2024
- Rathaus Gutenbergstraße geplante Ausführung ab II/2020
- Rathaus Neubau/Abriss geplante Ausführung ab 2021
- Marktplatz 2. BA geplante Ausführung 2020/21
- Betriebshof Erweiterung Planung 2020, Ausführung 2021

Teilergebnishaushalt in T€

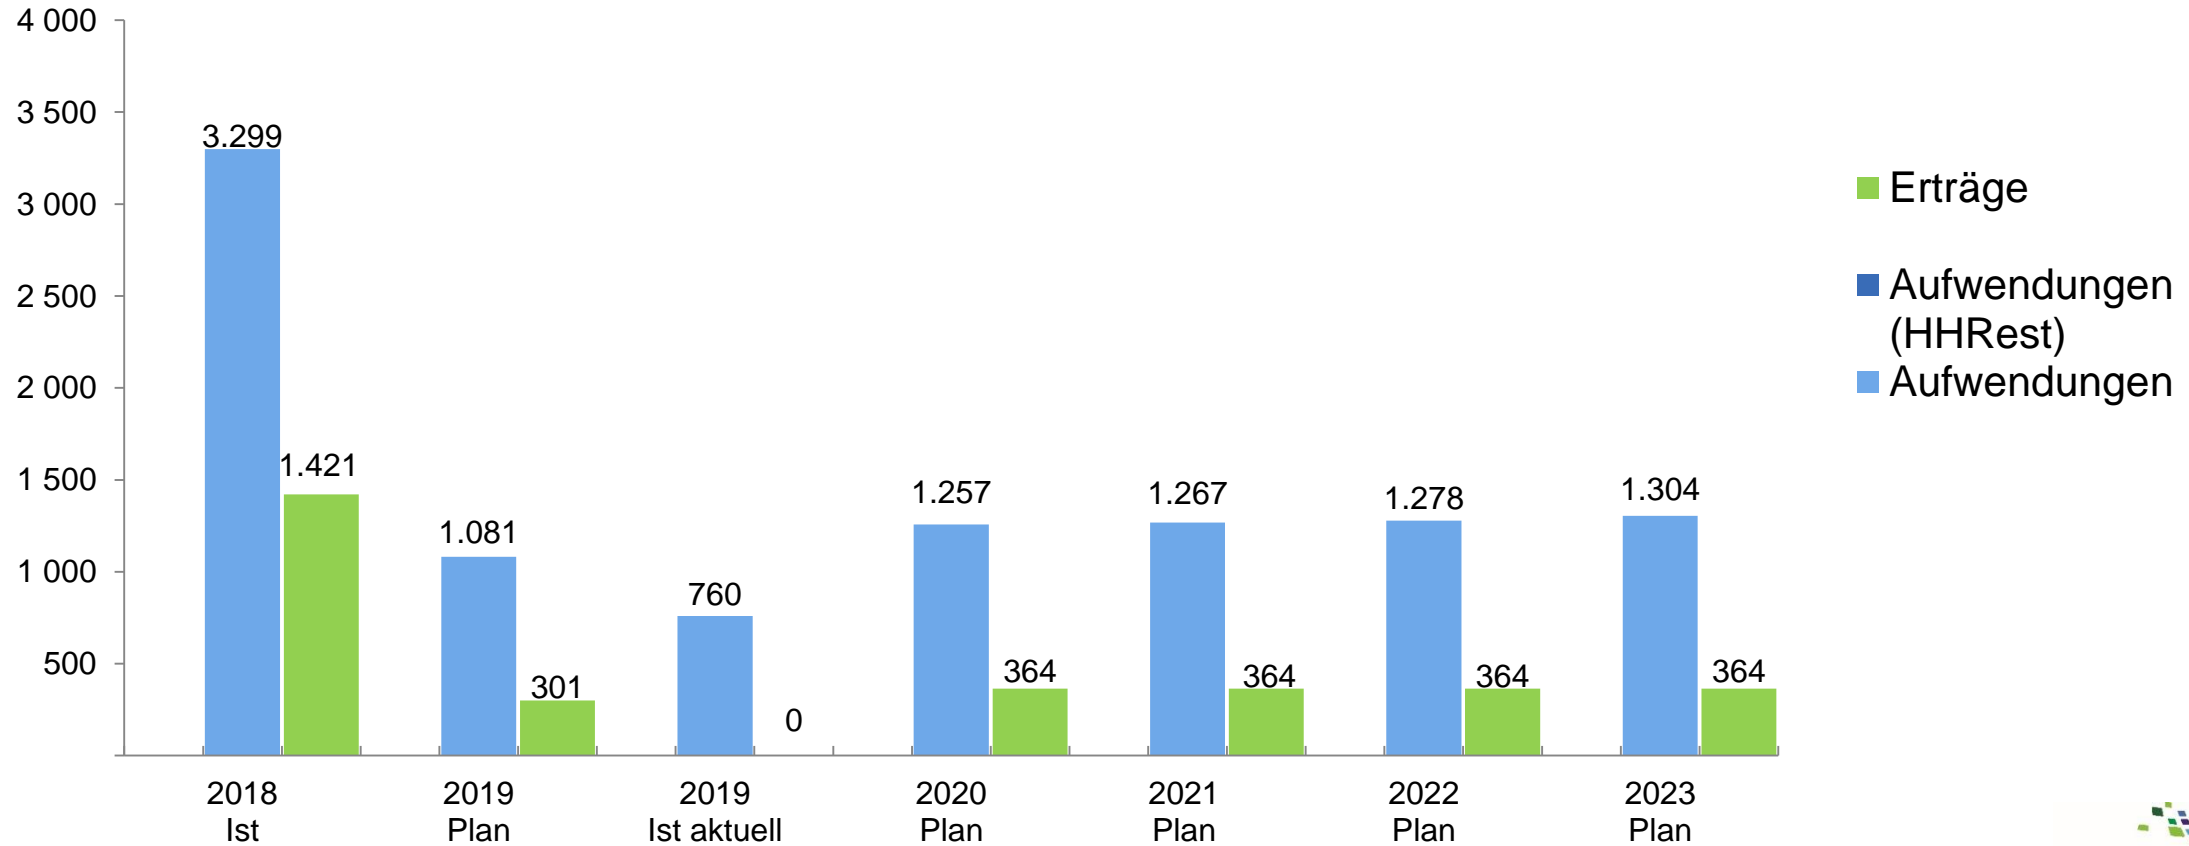

Investitionen des Teilhaushaltes in T€

